

(仮称) 泉ヶ丘消防署新庁舎 完成イメージ



令和3年8月19日

泉ヶ丘消防署庁舎建設予定地



## 工事お知らせ看板設置



令和3年8月20日  
造成工事が始まる





令和3年8月27日

竹の伐採終了



令和3年9月7日

建設予定地・完成イメージ看板設置完了





令和3年10月22日

造成工事中（敷地北側に擁壁の設置工事が始まる）



令和3年12月8日

造成工事中（擁壁工事が終わり側溝工事始まる）





令和4年1月12日  
造成工事完成近づく



令和4年2月22日  
造成工事完了





令和4年11月17日  
起工式が執り行われました。





令和4年12月2日

現場建築事務所が設置されました。



令和5年1月17日

本格的な工事が始まりました。






令和5年1月24日  
仮囲いの設置完了



令和5年1月24日  
杭打ち工事始まる

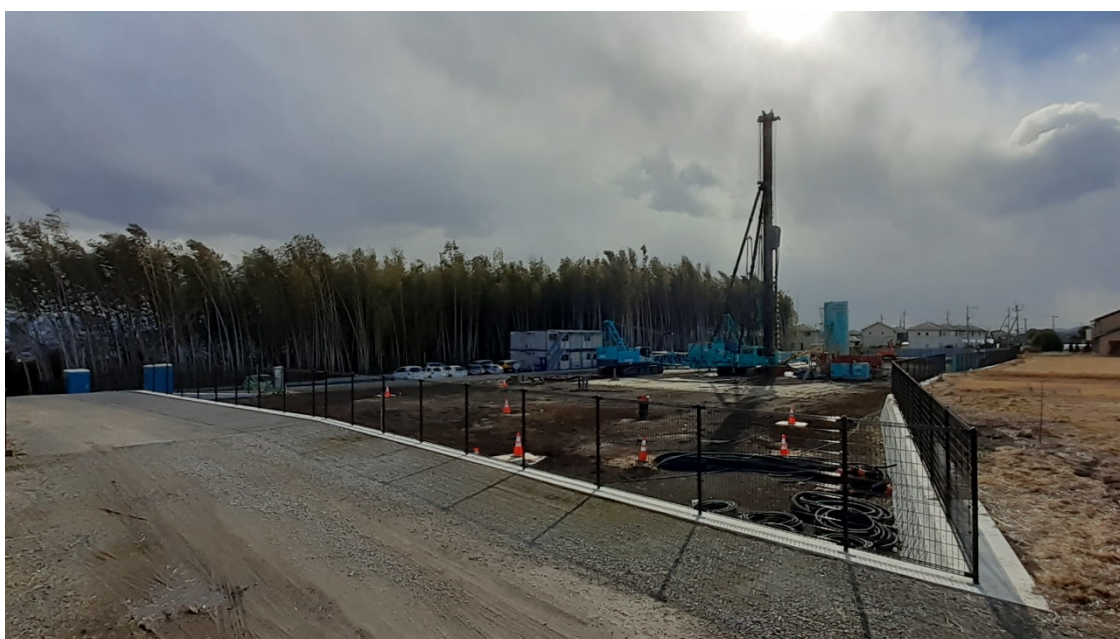



令和5年2月21日

基礎根切作業



令和5年2月28日

足場組立作業開始



令和5年3月28日

埋戻し作業



令和5年4月18日

型枠工事開始





令和5年5月2日

2階部分足場組立完了



令和5年5月23日

屋上部分足場組立及び1階部分の型枠が外れた



令和5年6月20日

2階のコンクリート打ち完了



令和5年7月18日

車庫棟の基礎工事が始まりました。





令和5年7月25日

車庫棟の基礎型枠工事が始まりました。



令和5年8月1日

車庫棟の基礎埋め戻しが始まりました。



令和5年8月10日

車庫棟の鉄骨が建ちあがり始めました。



令和5年8月23日

車庫棟の屋根及び足場、土間コンクリートが完了しました。





令和5年9月12日

庁舎西側の足場が撤去されました。



令和5年9月26日

庁舎玄関付近の足場が撤去されました。



令和5年10月13日

完成間近







令和5年12月22日

ようやく完成しました。

令和5年12月19日から仮運用を開始し、令和6年2月1日からは名称を桜消防署に改め運用を開始します。



